


Шаблон отчета о статусе проекта/ дорожной карты

Бадин Андрей Анатольевич,
Генеральный директор
«Проектные сервисы»

Шаблон отчета о статусе проекта (Общий статус проекта)

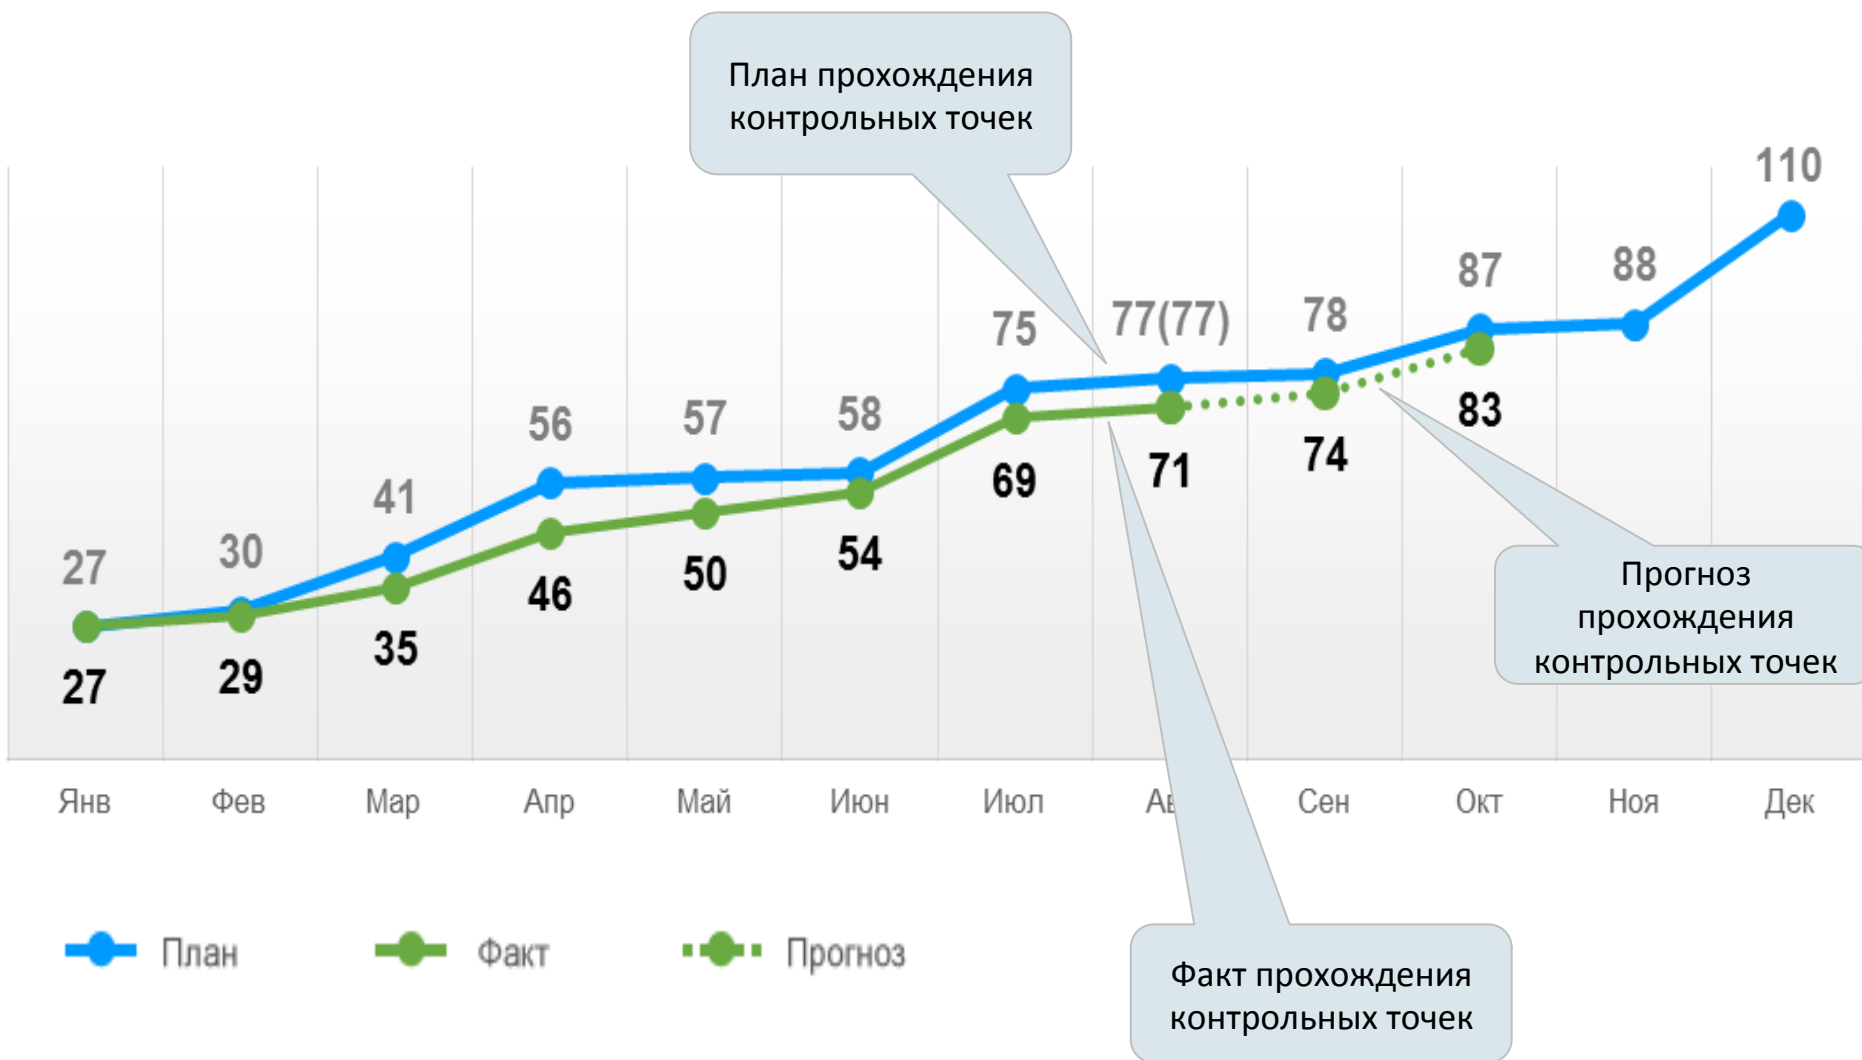

Шаблон отчета о статусе проекта (Статус по блокам)

Блоки работ	Статус	Прогноз
<Название блока> <Фамилия И.О. руководителя блока работ>	15	2 4
<Название блока> <Фамилия И.О. руководителя блока работ>	31	1
<Название блока> <Фамилия И.О. руководителя блока работ>	30	4 14
<Название блока> <Фамилия И.О. руководителя блока работ>	10	3 5
<Название блока> <Фамилия И.О. руководителя блока работ>	3	1
<Название блока> <Фамилия И.О. руководителя блока работ>	1	1
<Название блока> <Фамилия И.О. руководителя блока работ>	2	1
<Название блока> <Фамилия И.О. руководителя блока работ>	5 2	3

Достигнутые
контрольные точки

Недостигнутые
контрольные точки

Прогноз достижения
контрольных точек
ближайших отчетных
периодов

Шаблон отчета о статусе проекта (Статус прохождения контрольных точек)

№	Блок / Контрольное событие	Плановый срок	Факт / Прогноз	Ответственный	Комментарий
<Название блока> (<Фамилия И.О. руководителя блока работ>)					
1	<Наименование контрольного события из Плана-графика проекта>	дд.мм.гггг	дд.мм.гггг	<Фамилия И.О.>	<p><Содержательное описание результата, полученного вследствие наступления контрольного события, количественная и качественная оценка влияния результата на достижение целей проекта></p> <p>Для желтых и красных индикаторов – описание факторов, влияние которых приводит к нарушению сроков наступления контрольных событий или достижению плановых значений></p>
<Название блока> (<Фамилия И.О. руководителя блока работ>)					
2	<Наименование контрольного события из Плана-графика проекта>	дд.мм.гггг	дд.мм.гггг	<Фамилия И.О.>	<p><Содержательное описание результата, полученного вследствие наступления контрольного события, количественная и качественная оценка влияния результата на достижение целей проекта></p>



Своевременное выполнение



Отклонение не критично



Отклонение критично



Осталось

Шаблон отчета о статусе проекта (Прогноз прохождения контрольных точек)

Прогноз исполнения контрольных событий на ближайшие 3 месяца

№	Блок / Контрольное событие	Плановый срок	Прогнозный срок	Ответственный	Комментарий
<Название блока> (<Фамилия И.О. руководителя блока работ>)					
1	<Наименование контрольного события из Плана-графика проекта>	дд.мм.гггг	дд.мм.гггг	<Фамилия И.О.>	<p><Содержательное описание ожидаемого результата, вследствие наступления контрольного события, количественная и качественная оценка влияния результата на достижение целей проекта.</p> <p>Для желтых и красных индикаторов – описание факторов, влияние которых приводит к нарушению сроков наступления контрольных событий или достижению плановых значений></p>

Прочие проблемы и риски

№	Наименование проблемы \ риска	Комментарий
1.	<Описание проблемы или риска>	
2.	<Описание проблемы или риска>	



Своевременное выполнение



Отклонение не критично



Отклонение критично



Осталось

Выводы

Отчет о статусе Дорожной карты/проекта должен включать разделы:

- Визуальное отражение динамики прохождения контрольных точек по месяцам нарастающим итогом с прогнозом на 2-3 месяца
- Сравнение достижений разных подразделений по прохождению контрольных точек
- Детальную информацию по каждой не пройденной контрольной точке (комментарий и прогнозную дату)
- Детальную информацию по рискам не прохождения контрольных точек и другими рискам проекта/Дорожной карты
